


Easy Panel イージーパネル

取扱地域 **北海道** **東北** **関東** **中部** **北陸**
近畿 **中国** **四国** **九州** **沖縄**


お問合せ：高速道路部
TEL：075-631-8826

一日で壁の修復と内装が完了！大幅な工期短縮と工費節減が図れます。

施工・2班体制(パネル取付班・支保工、モルタル充填班)とした。 施工速度30枚/日(27m)

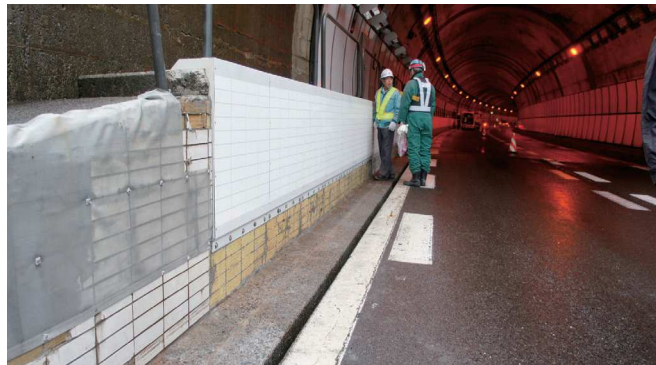

柳ヶ瀬TN上り坑口

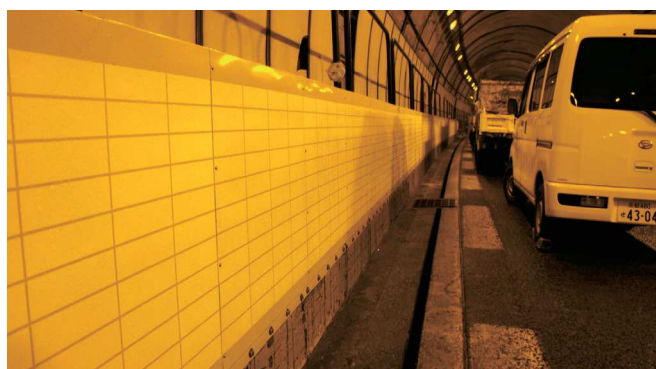

トンネル内取付状況

各部位詳細



消火栓部ステップ



消火栓部パネル



支柱部開口、パネルジョイント




監視員通路上面水路、縦排水流入部




監視員通路上部
(支柱部取合い)




ハンドホール部



コンパネ固定金具取付



コンパネ取付状況




充填モルタル練り混ぜ




充填モルタル流し込み状況
硬化時間3時間




支保工、モルタル充填班作業状況
パネル取付班はこの奥で作業中



パネル取付



コンパネ固定金具取付状況
(上面)



パネル取付班作業状況

1日のタイムテーブル											
時間	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
交通規制	開始	走行車線規制							解除		
パネル取付	パネル取付(30枚 27m)										1班
支保工	固定金具、コンパネ取付				取り外し						1班
モルタル充填	モルタル練混ぜ、充填、養生					養生					

位置図



カルバート・
下水道

擁壁・
法面保護工

道路

高速道路

水路関連

河川・海洋・
環境

貯留・
防災システム

通信関連

建築・宅造

特殊工法・
新素材

参考資料
